

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

OB 648602

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 392/150205061

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Breestraat 15/5

3500 Hasselt

EIGENAAR: Vandewen Evelien

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: dem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 84 120 534

Index: _____

Datum van het onderzoek: 5/2/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.10.81 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut 50 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 50A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: < 30 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Geen

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/2/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 392 Brecht Swinnen
nr. + naam + handtekening

De directeur,

KEUKEN

WC

HAL

BADKAMER

BERGING

SLAAPKAMER

LIVING

LIVING

FORNUIS

VOB 5X4

25A


C

BTU397
Brecht Sunnen
5/2/15

ALL ROUND ELEKTRO BOONS

Beekstraat 4 - 3945 Ham


Tel/Fax 013/66 28 48

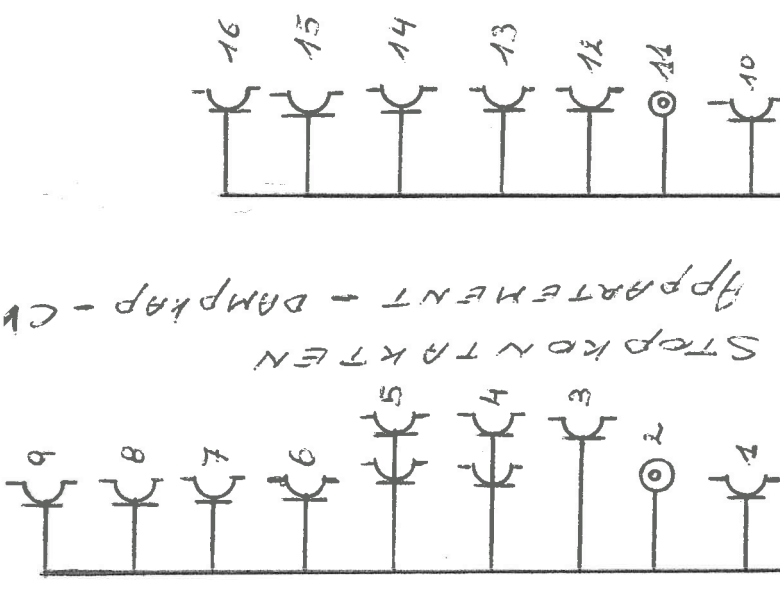


VOB 3X2,5

20A

H






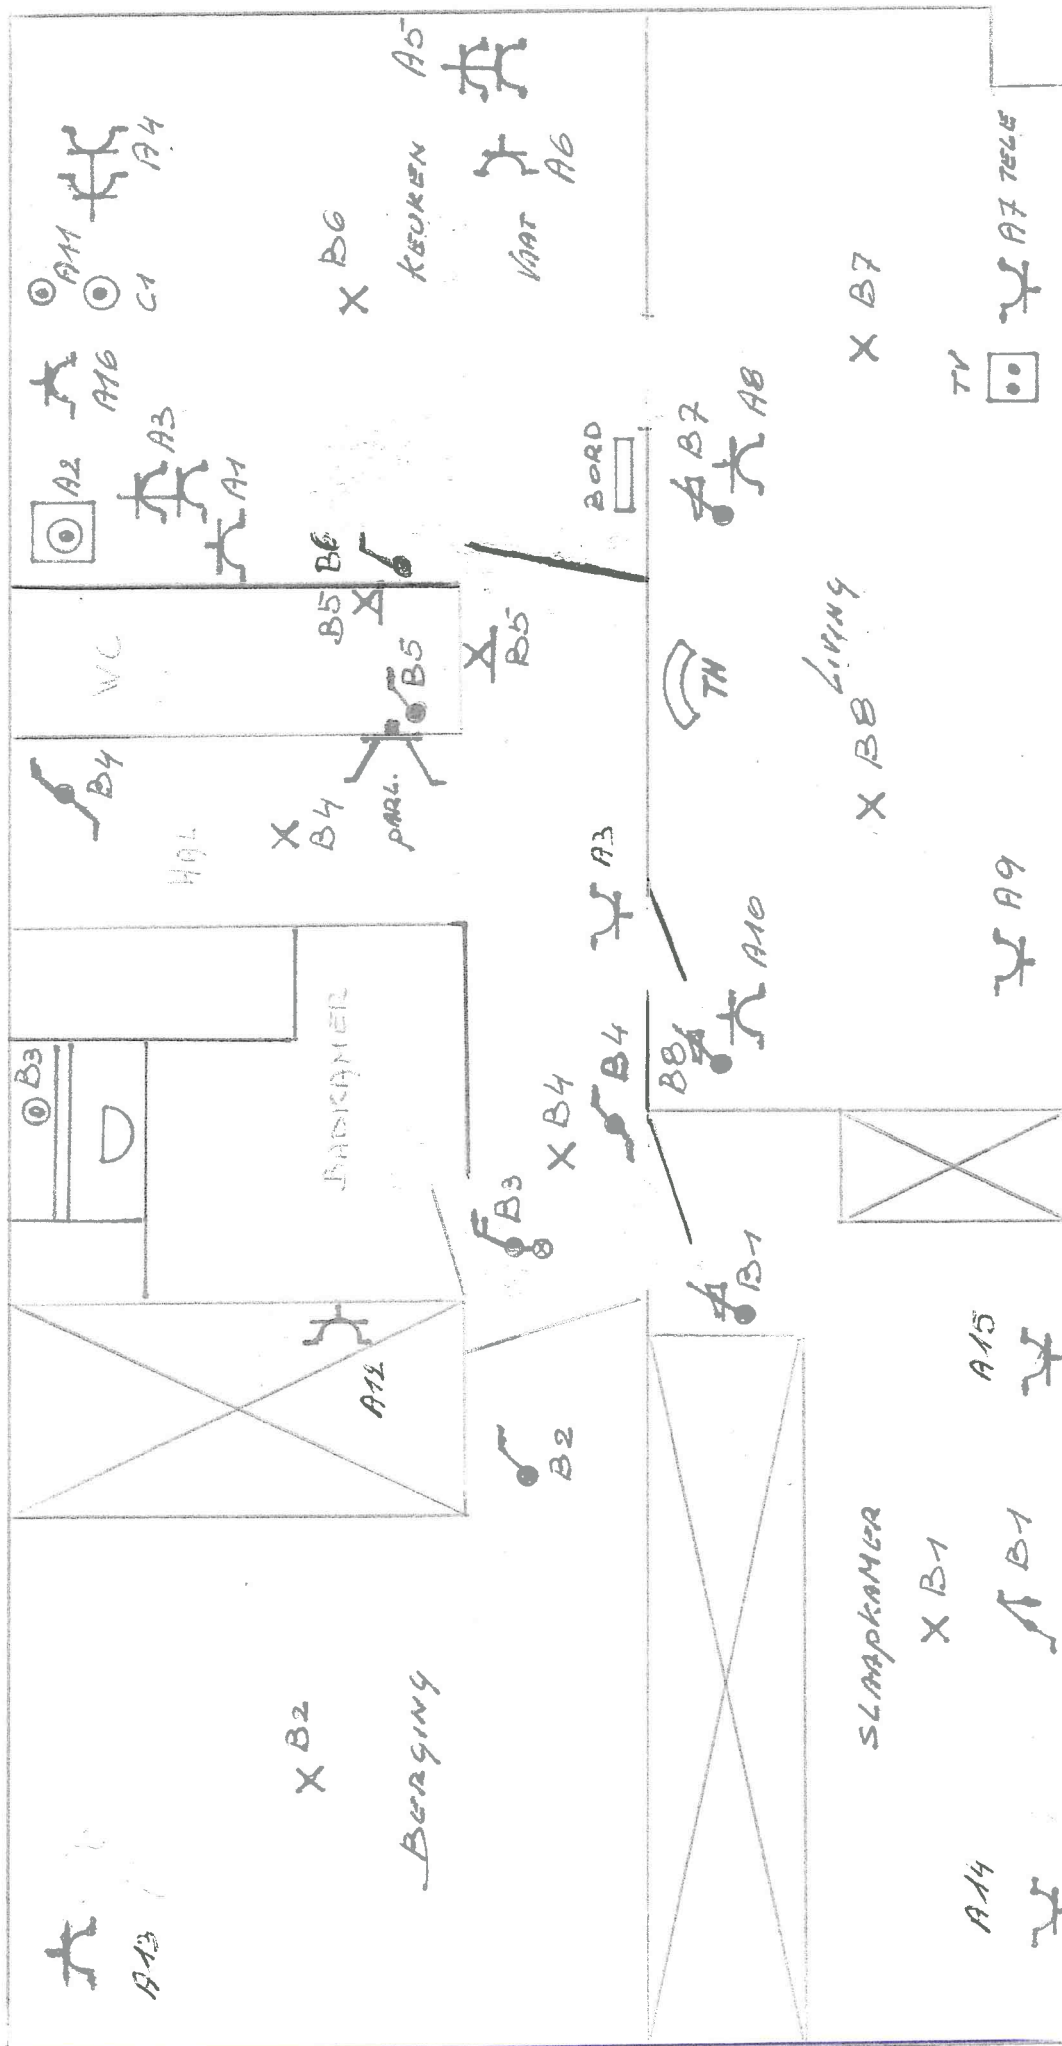


BTU382

ALL ROUND ELEKTRO BOONS

Beekstraat 4 - 3945 Ham


Tel/Fax 013/66 28 48

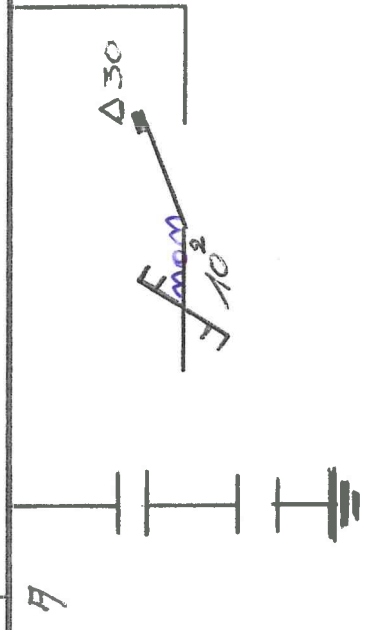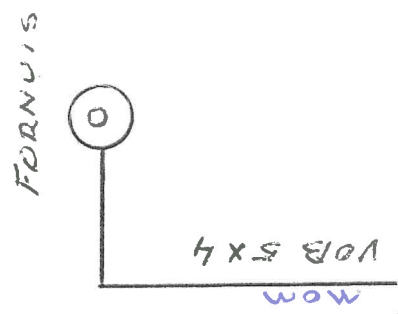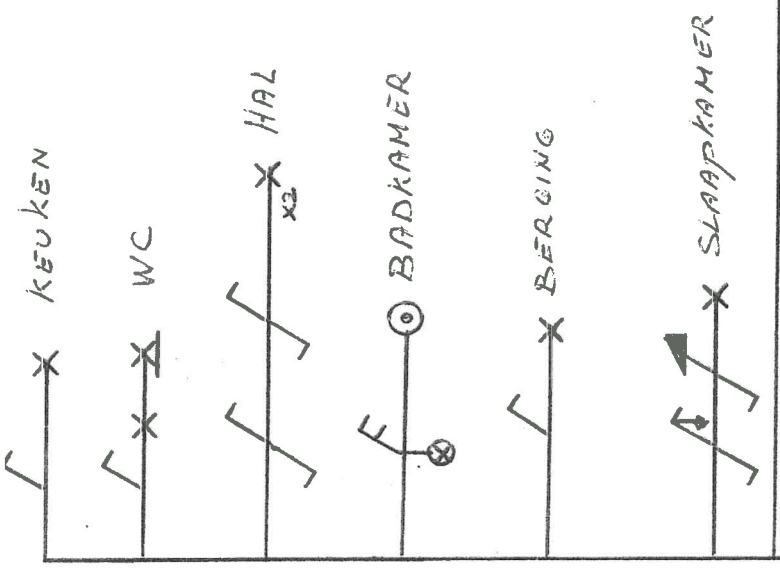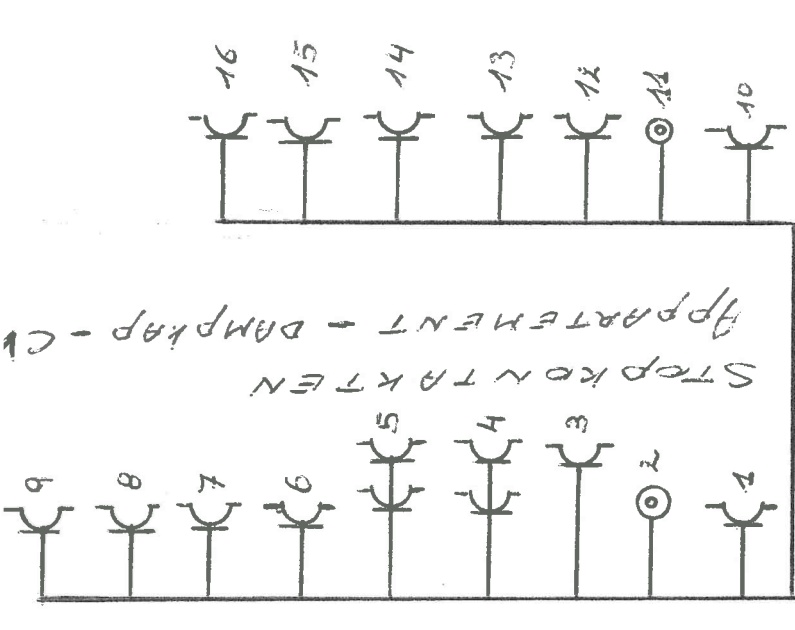

A B C

ALL ROUND ELEKTRO BOONS
Beekstraat 4 - 3945 Ham
Tel/Fax 013/66 28 48

BTU392
Brecht Summer
5/2/15
[Signature]

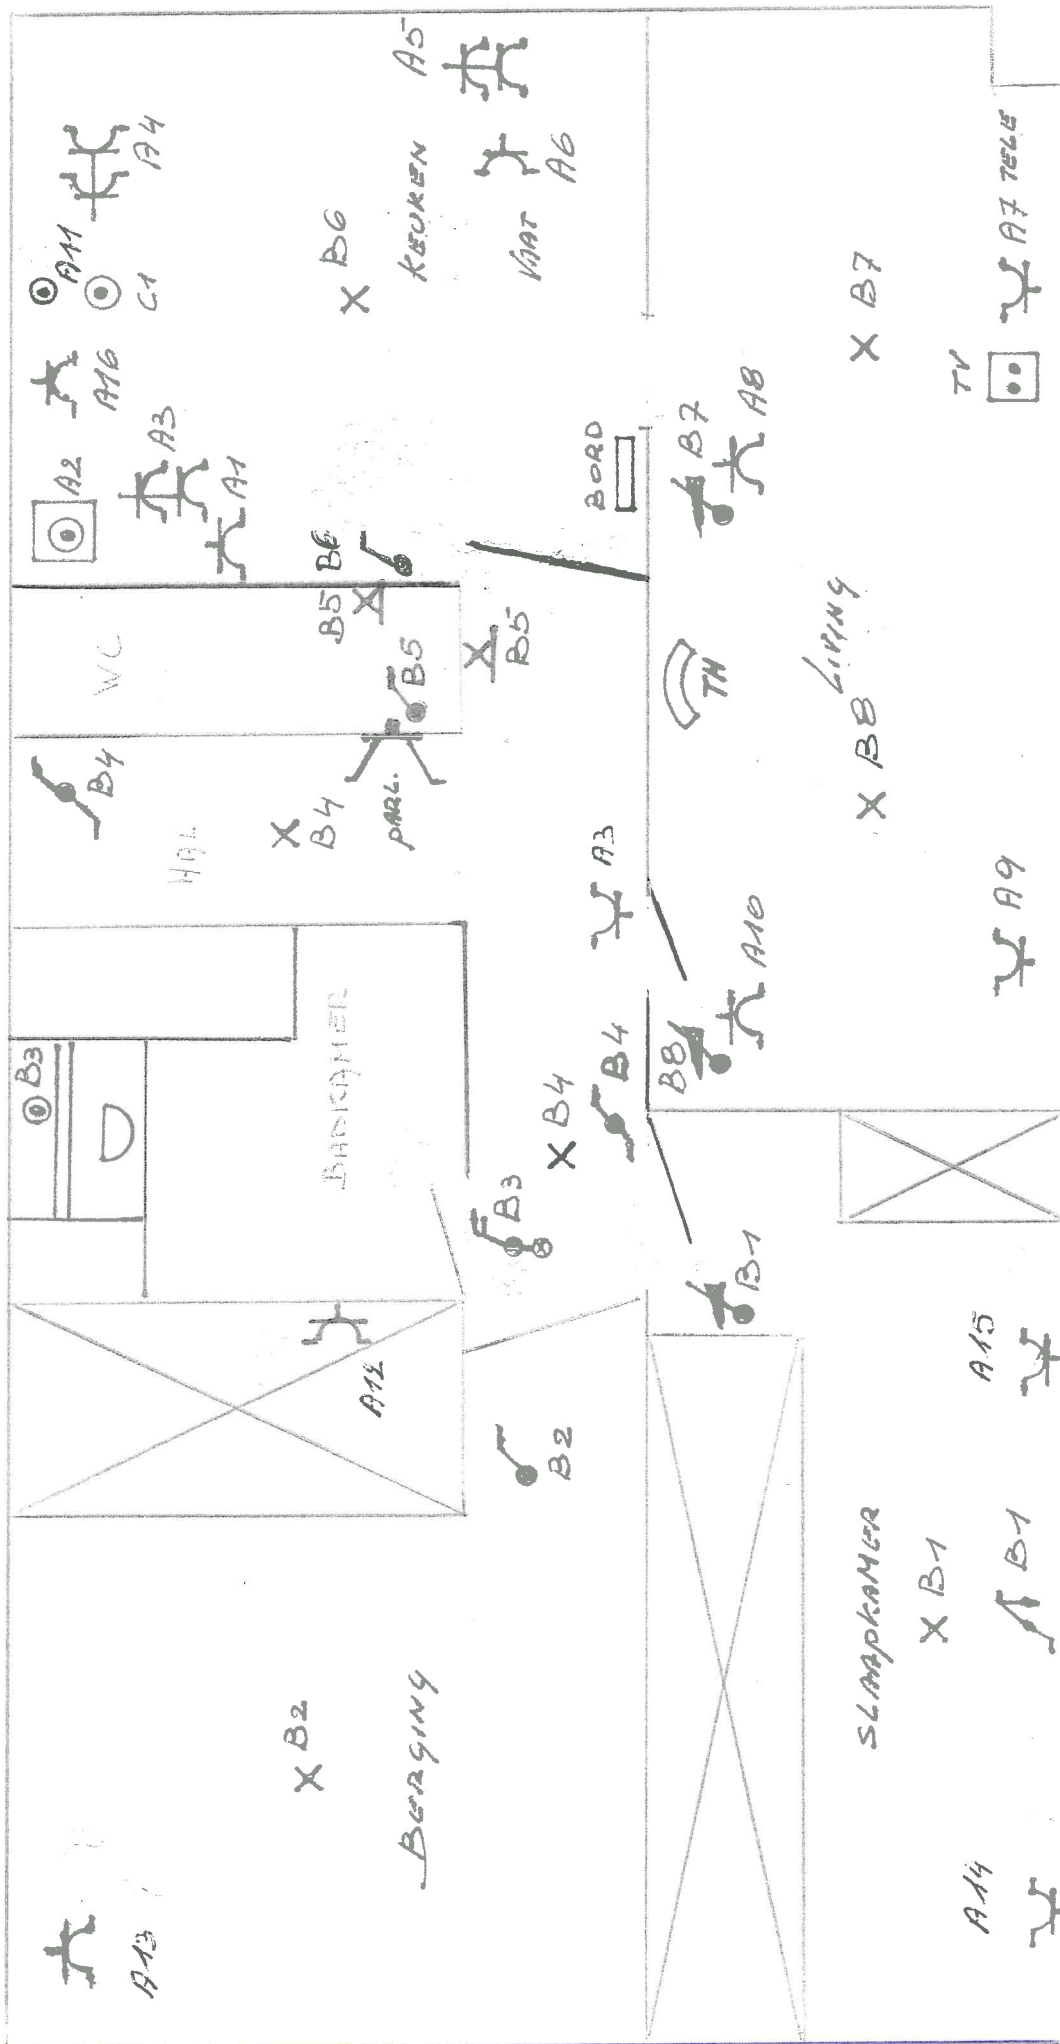


ALL ROUND ELEKTRO BOONS

Beekstraat 4 - 3945 Ham

Tel/Fax 013/66 28 48

BTV392

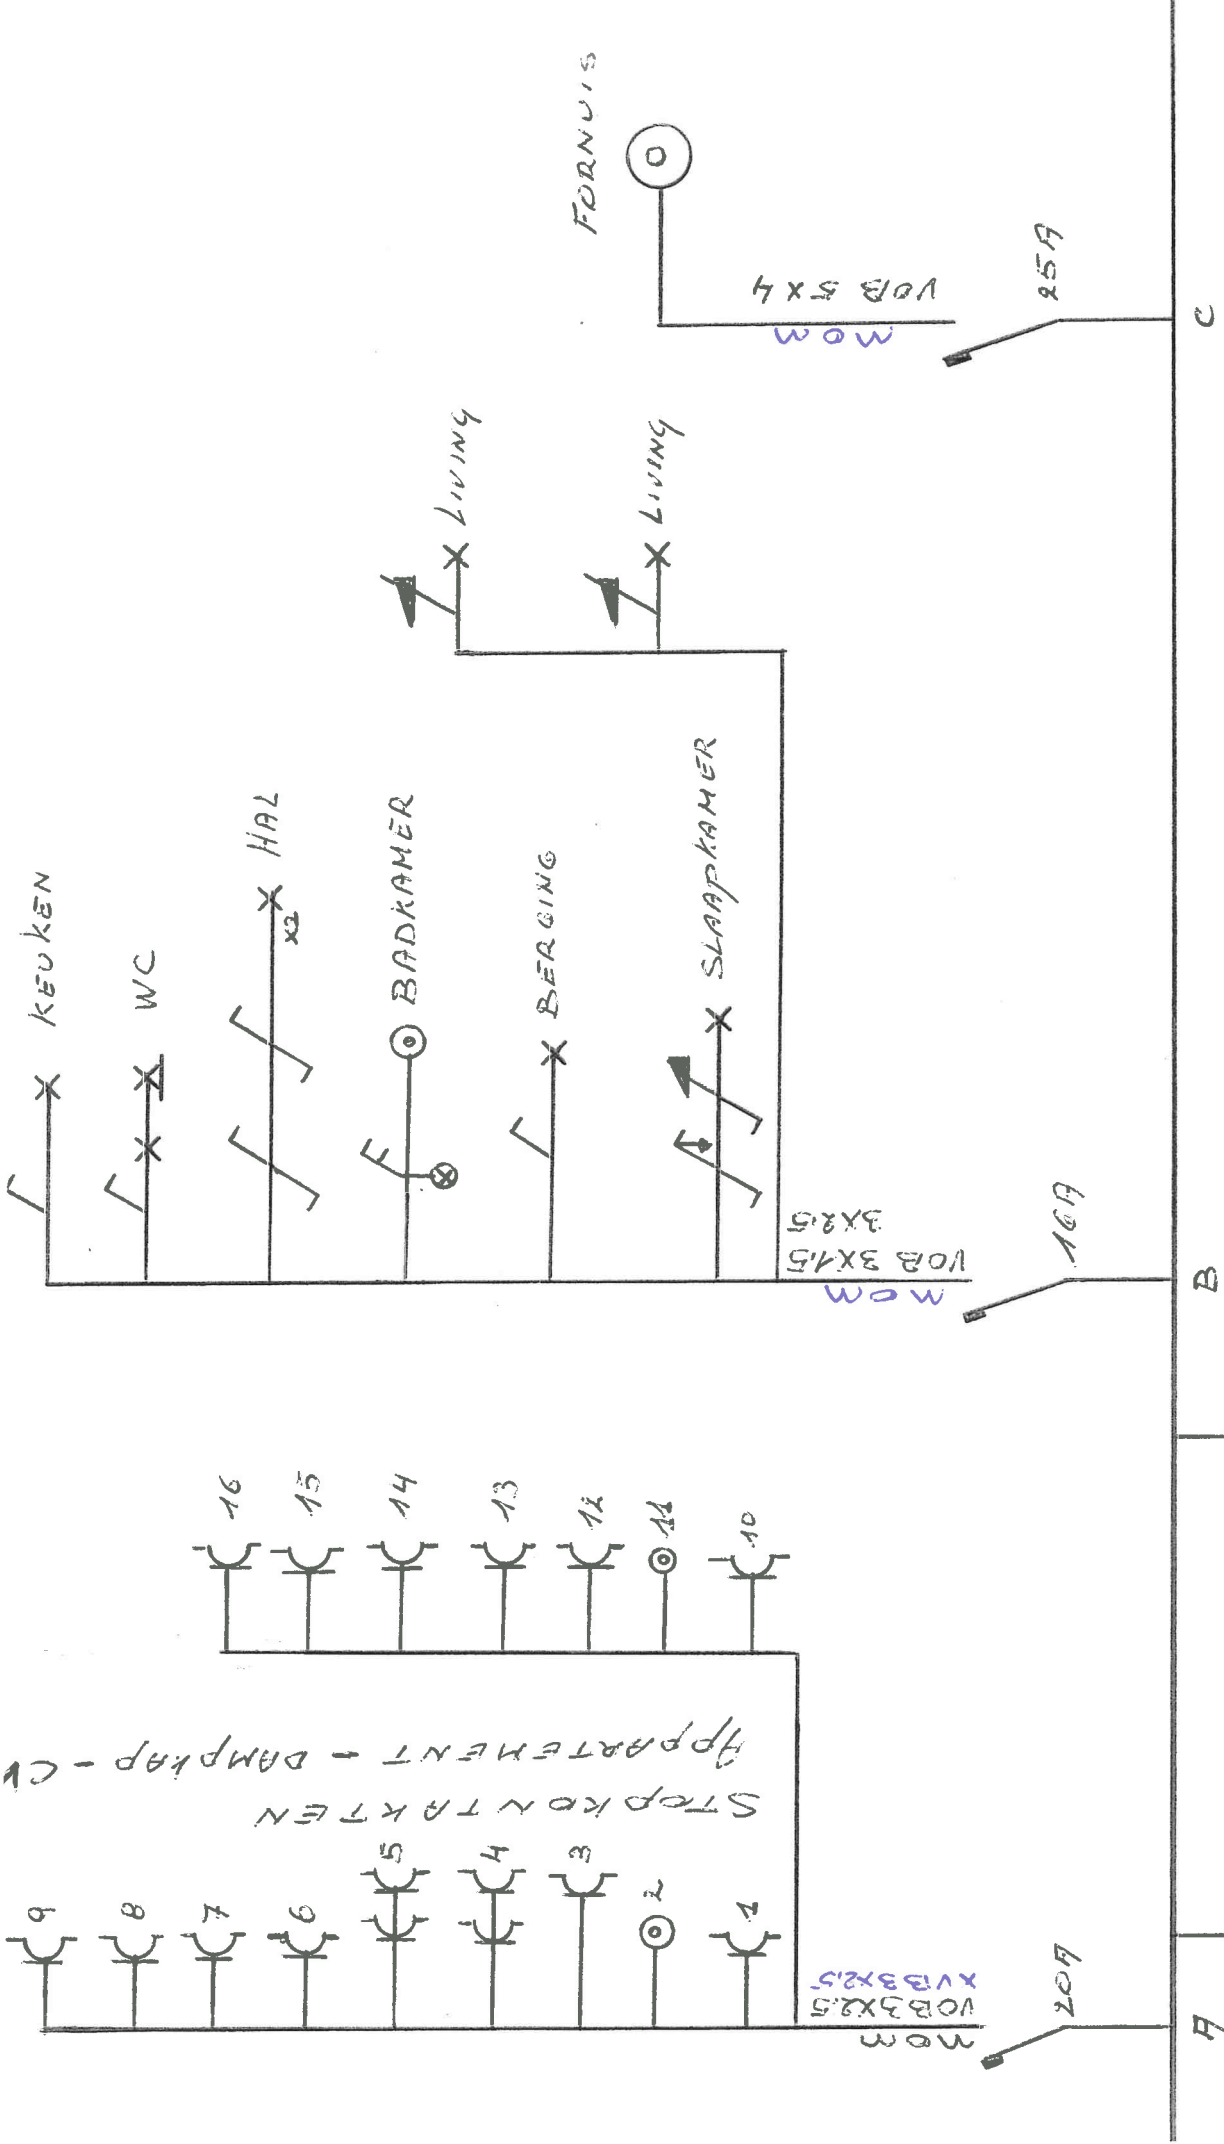

ALL ROUND ELEKTRO BOONS
 Beekstraat 4 - 3945 Ham
 Tel/Fax 013/66 28 48

